



**Изградба на локален пат во село Младо Нагоричане, маало Трендајловци,
Општина Старо Нагоричане**

Вкупна должина на патот: $L = 1010 \text{ m}$

- Проектирана брзина: 30 km/h
- Ширина на профил на патот: $4.75 \text{ m} - 5.00 \text{ m}$
- Максимален попречен профил: 7%
- Максимален надолжен профил: 12%

Структура на тротоар

- БНХС 16 – асфалтен слој: $d = 7 \text{ cm}$
- Основен слој од кршен камен: $d = 30 \text{ cm}$

Предметната улица е дел од Т8Д4 и е една од вкупно двете улици за реализација во општина Старо Нагоричане според овој договор.

Работите ги изведува градежната компанија „Ленди Груп ДООЕЛ Скопје“.

Преглед на проектот

Градежните работи ги вклучуваат следните задачи:

- Обезбедување и обележување на трасата
- Стружење (планирање) на постојниот пат
- Изградба на насип
- Механички ископ на почва во широк ископ III и IV категорија со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од инвеститорот-Општина
- Набавка, транспорт и монтажа на тампонски слој од кршен камен за патот $d=30 \text{ cm}$ до потребното набивање
- Набавка на материјали, транспорт и изградба на бетонски сливници 30/30/30
- Асфалтно поплучување со БНХС 16, $d = 7 \text{ cm}$

Пред изградбата улицата, односно коловозната конструкција беше во лоша состојба, односно постоеше земјен пат. Со цел да се подобри сообраќајната поврзаност како и непречено и безбедно функционирање на патниот сообраќај, неопходно беше да се реконструира истиот пат. Вредноста на потпишаниот договор е 9.075.083 денари. Во моментот се завршени 93 % од улицата. Во прилог се фотографии кои ја документираат улицата пред изградбата, за време на изградбата и завршените делници.




LOCAL ROADS
CONNECTIVITY PROJECT



"H"




LOCAL ROADS
CONNECTIVITY PROJECT

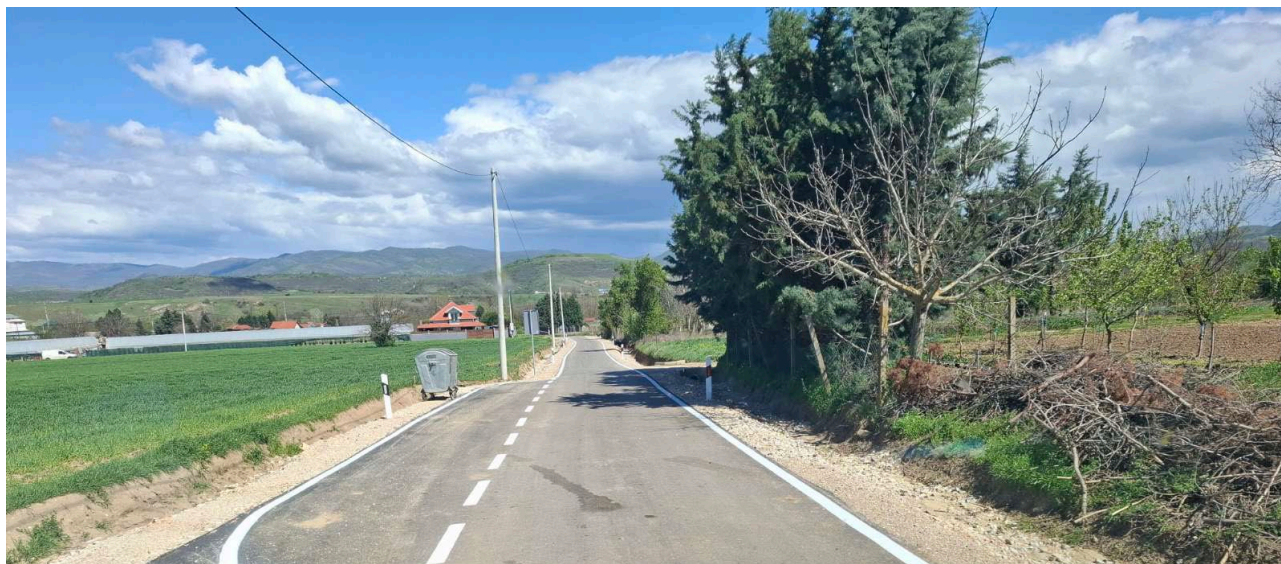

"H"



LOCAL ROADS CONNECTIVITY PROJECT

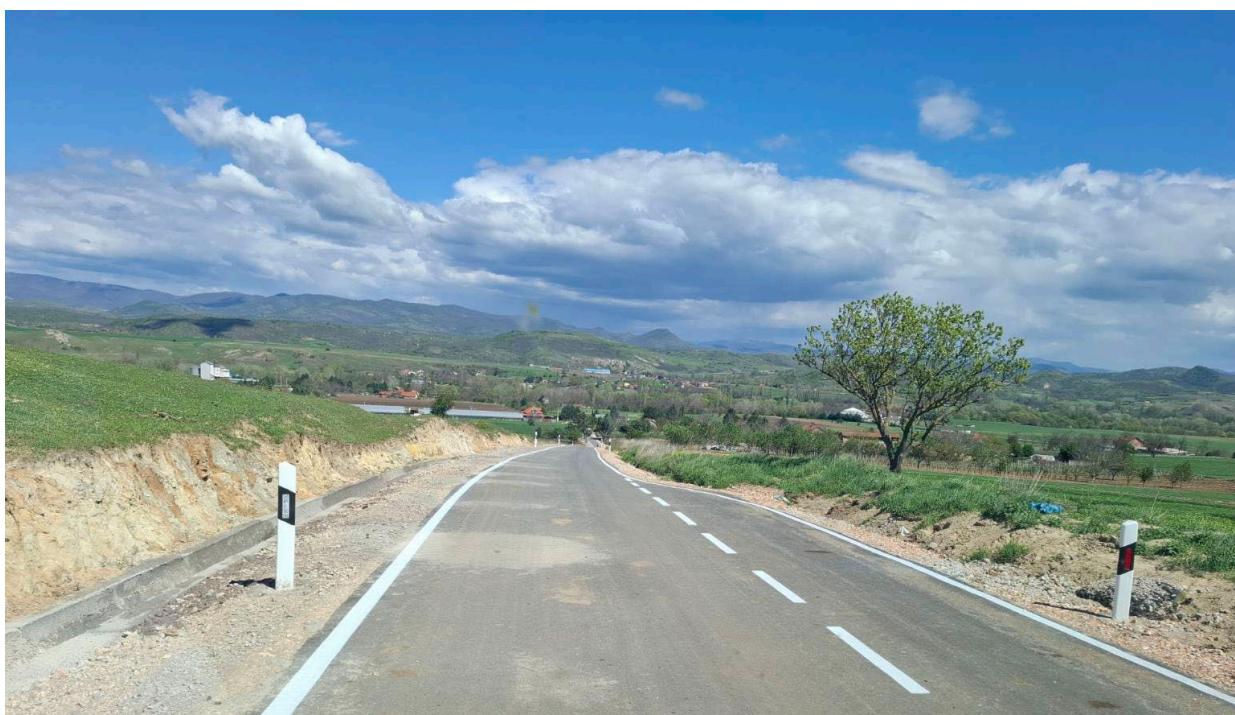

“H”
