



LOCAL ROADS CONNECTIVITY PROJECT



Изградба на улица „2“ во село Ранковце, Општина Ранковце

Вкупна должина : $L = 750\text{m}$

- Проектирана брзина: 40 km/h
- Ширина на профил: 8.50 m
- Максимален попречен профил: 2.50%
- Максимален надолжен профил: 2.77%

Структура на тротоарот

- БНХС 16А – асфалтен слој: $d = 7\text{cm}$
- Основен слој на кршен камен: $d = 30\text{cm}$

Предметната улица е дел од Т8Д4 и е единствена за имплементација во општина Ранковце според овој договор.

Работите ги изведува градежната компанија „Ленди Груп ДООЕЛ Скопје“.

Преглед на проектот

Градежните работи ги вклучуваат следните задачи:

- Обезбедување и обележување на трасата
- Стружење (планирање) на постојниот пат
- Изградба на насип
- Механички ископ на почва во широк ископ III и IV категорија со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од инвеститорот-општината
- Набавка, транспорт и монтажа на тампон слој од кршен камен за патот $d_{\min}=30\text{ cm}$ до потребното набивање
- Набавка, транспорт и монтажа на бетонски рабници (МБ40 18/24)
- Набавка, транспорт и монтажа на бетонски рабници (МБ40 8/24)
- Набавка, транспорт и монтажа на бетонски павер елементи за тротоар $d=6\text{cm}$, поставени на ситен песок од 3-5cm
- Асфалтно поплочување со БНХС 16А, $d = 7\text{cm}$

Пред изградбата улицата, односно коловозната конструкција беше во лоша состојба, односно постоеше земјен пат. Со цел да се подобри сообраќајната поврзаност како и непречено и безбедно функционирање на патниот сообраќај, неопходно беше да се реконструира истиот пат.

Вредноста на потпишаниот договор е **14.928.360** денари. Во моментот се завршени **95 %** од улицата. Во прилог се фотографии кои ја документираат улицата пред изградбата, за време на изградбата и завршените делници.



**LOCAL ROADS
CONNECTIVITY PROJECT**






**LOCAL ROADS
CONNECTIVITY PROJECT**





**LOCAL ROADS
CONNECTIVITY PROJECT**

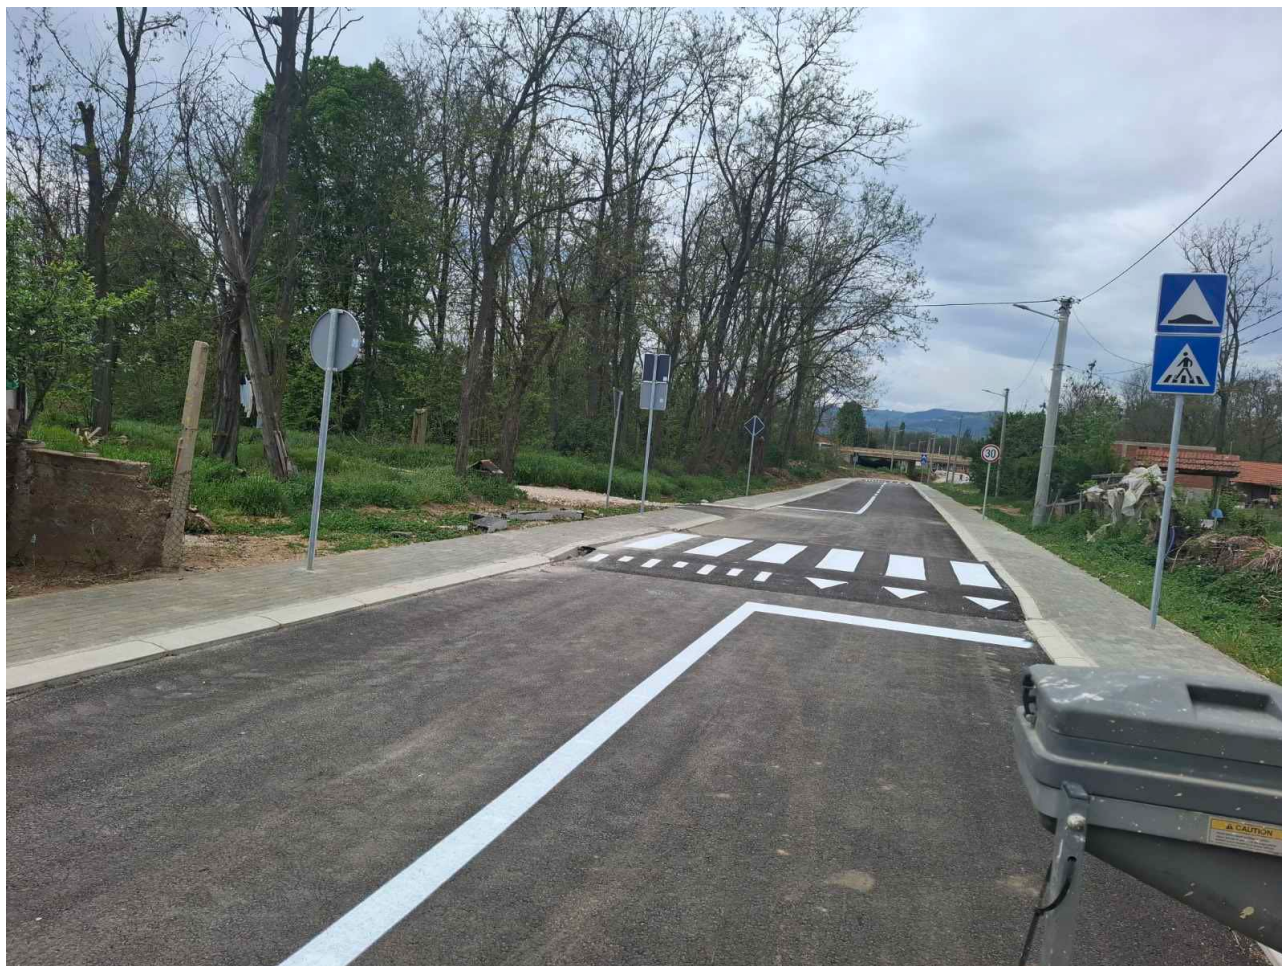



**LOCAL ROADS
CONNECTIVITY PROJECT**

