



Реконструкција на локален пат до село Стрновац, општина Старо Нагоричане

Вкупна должина на патот: $L = 1620\text{m}$

- Проектирана брзина: 30 km/h
- Ширина на профил на патот: 3,5-m
- Максимален попречен наклон: 2.50%
- Максимален надолжен наклон: 14,02%

Структура на тротоар

- БНХС16А – асфалтен слој: $d = 7\text{cm}$
- Основен слој од кршен камен: $d = 30\text{cm}$

Предметната улица е дел од Т8Д4 и е една од вкупно двете улици за реализација во општина Старо Нагоричане според овој договор.

Работите ги изведува градежната компанија „Ленди Груп ДООЕЛ Скопје“.

Преглед на проектот

Градежните работи ги вклучуваат следните задачи:

- Обележување и обезбедување на трасата
- Стружење (планирање) на постојниот пат
- Механички ископ на почва во широк ископ III и IV категорија со утовар и транспорт до локација или депонија посочена од инвеститорот-општината
- Набавка, транспорт и монтажа на тампонски слој од кршен камен за патот $d_{\min}=30\text{cm}$ до потребното набивање
- Набавка, транспорт и монтажа на бетонски рабници (МВ40 18/24)
- Асфалтно поплочување со БНХС 16А, $d = 7\text{cm}$


Пред изградбата улицата, односно коловозната конструкција беше во лоша состојба, односно постоеше земјен пат. Со цел да се подобри сообраќајната поврзаност како и непречено и безбедно функционирање на патниот сообраќај, неопходно беше да се реконструира истиот пат.

Вредноста на потпишаниот договор е 12.253.920 денари.

Во моментот се завршени 94 % од улицата. Во прилог се фотографии кои ја документираат улицата пред изградбата, за време на изградбата и завршените делници.



LOCAL ROADS CONNECTIVITY PROJECT

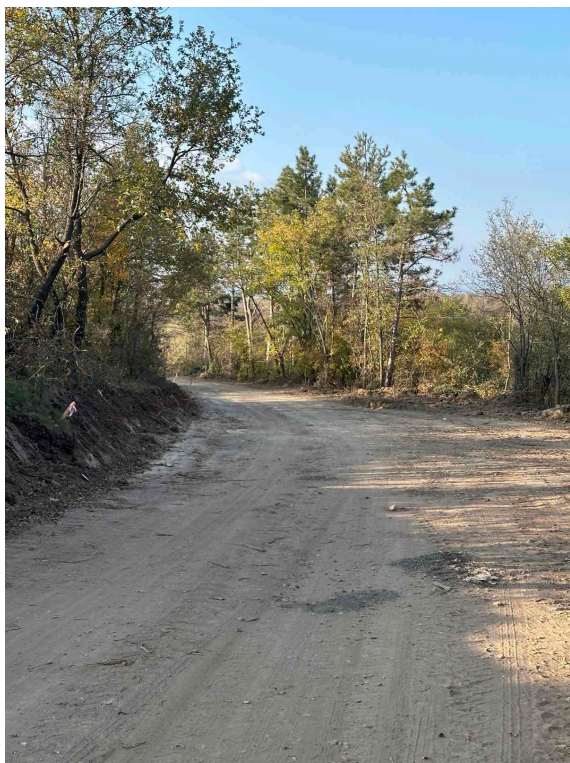

"H"




LOCAL ROADS CONNECTIVITY PROJECT



"H"



LOCAL ROADS
CONNECTIVITY PROJECT

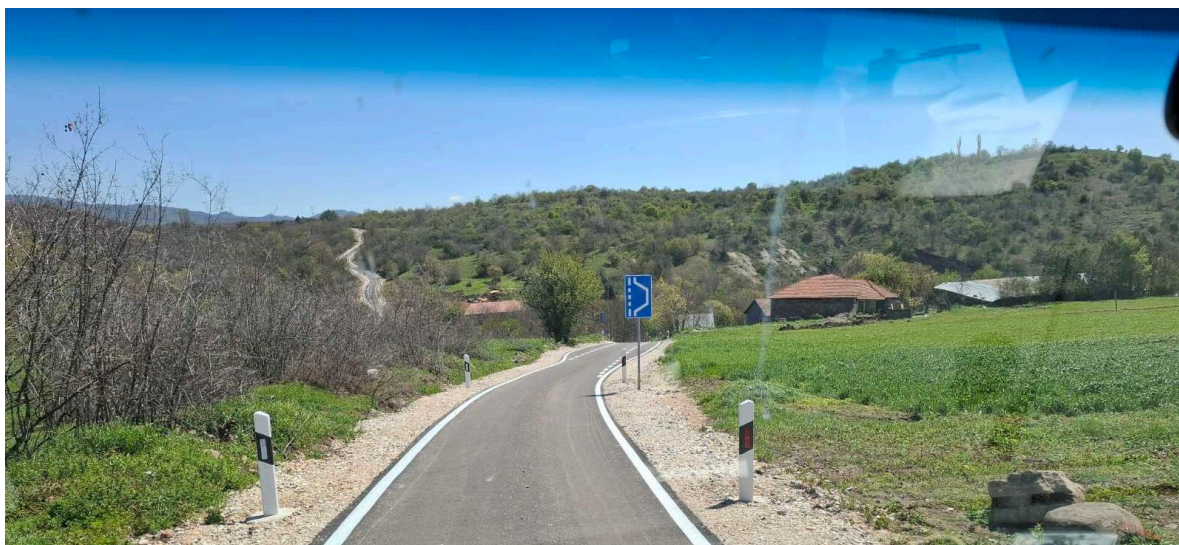

"H"
